

Vitesse de vent > **100** km/h

Epaisseur de neige > **4** cm

Bureau centralisateur

Numéro d'identification

**75-162**

**C-075-2003-162**

du : **28/10/2003**

Etabli par la préfecture de

**75**

**Paris**

Valable jusqu'au

**14/04/2020**

## PROPRIETAIRE

**OLIVIER COURCIER**  
**12 rue de la Calade**

Resp: **COURSIER OLIVIER**

**12480**

Tel: **06 84 30 62 67**

Fax:

Mob: **06 84 30 62 67**

Type **CHAPITEAU**

Modèle **SCOLA TELONI 18M ROND**

Fabricant **SCOLA TELONI**

Coloris initial Toit **BLEU**

Tour **BLEU BANDES BLANCHES**

Le CTS peut recevoir > 300p

☐ Oui

☒ Non

O. agréé

Installations électriques propres

☐ Oui

☒ Non


O. agréé

|   | Procès verbal n° | Réaction | Validé le  | Laboratoire | Fabricant       | Coloris         |
|---|------------------|----------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| T | A110265          | M2       | 08/12/2000 | LNE         | LA PLASTIVENETA | DIVERS BICOLORE |
| O |                  |          |            |             |                 |                 |
| I |                  |          |            |             |                 |                 |
| L |                  |          |            |             |                 |                 |
| E |                  |          |            |             |                 |                 |
| S |                  |          |            |             |                 |                 |

## MONTAGE

Schéma type  
de configuration

Photo non  
contractuelle de l'  
installation

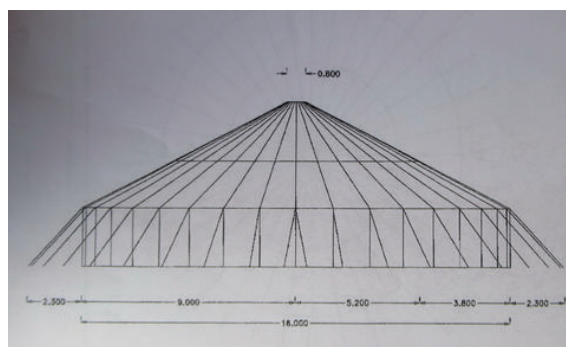

| QUANTITATIF     |            |      | PINCES |               |   |             | HAUBANS    |
|-----------------|------------|------|--------|---------------|---|-------------|------------|
| Nb              | H.         | ?    | Nb     | H.            | ? | Arrachement | Résistance |
| MATS            | 1          | 8.50 | 114    | 4             |   | daN         | daN        |
|                 | 36         | 2.30 | 42     | 40            |   | 380 daN     | daN        |
| Poteaux de tour |            |      |        |               |   |             |            |
| GRADINS         | Nature     |      |        | Type NEANT    |   |             |            |
|                 | Nb places  |      |        | Vérificateur  |   |             |            |
|                 | Nb rangées |      |        | N° rapport Du |   |             |            |

Dans le cas où un plancher serait liaisonné mécaniquement à la structure du CTS et mis en service, le poids propre d'une partie de ce plancher pourrait être pris en compte en déduction des valeurs utilisées pour le calcul du liaisonnement au sol.  
 Seules les indications fournies par le fabricant de la structure sont admissibles

## SUIVI DE L'EVOLUTION DE L'ETABLISSEMENT

Date et lieu du dernier passage de la commission de sécurité

| Contrôles et vérifications       | Organisme | Vérifié le | Validité   | Contrôleur    |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| Structure et Toile               | AVERTECK  | 15/04/2018 | 14/04/2020 | BRUNO TRINCHE |
| Electricité bureau agréé         |           |            |            |               |
| Electricité technicien compétent |           |            |            |               |
| Chauffage / climatisation        |           |            |            |               |
| Gradins                          |           |            |            |               |
| Moyens de secours                |           |            |            |               |

(1) : cette rubrique n'est renseignée que si l'établissement dispose d'installations techniques qui lui sont propres. Dans le cas contraire, les installations doivent être vérifiées par une personne ou un organisme agréé. Il y a lieu de vérifier la présence des vignettes en cours de validité.

Rappel de l'article CTS 31 (extraits) : Demande d'implantation - Attestation de bon montage - Ouverture au public

§ 1. Avant toute implantation dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire au moins un mois avant la date d'ouverture au public l'extrait de registre...

Commentaires :

1) Il est préférable d'accompagner l'extrait de registre des documents suivants :

- un plan d'implantation de l'établissement dans son environnement ;
- le type d'activité exercée et le plan des aménagements intérieurs ;
- un descriptif des installations techniques.

2) Attestation de bon montage : le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 et sa circulaire d'application du 22 juin 1995 imposent à l'exploitant de tenir à disposition des autorités une attestation précisant que le montage et le liaisonnement de l'établissement ont été réalisés conformément aux prescriptions du fabricant. Cette attestation est rédigée par le responsable du montage

Rappel de l'article CTS 52 : Inspection avant ouverture au public

« Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes. »

Commentaire : ce contrôle doit permettre de :

- détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol ;
- détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique ;
- vérifier la vacuité des passages libres et des voies d'accès des secours ;
- vérifier la présence du service de sécurité incendie.

**RAPPEL: l'organisateur tiendra cet extrait de registre à disposition de la commission de sécurité accompagné d'une copie du dossier de demande d'implantation validée par l'autorité administrative**

## PARTIE RESERVEE A L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION OU DU SPECTACLE

Nom : .....

Représenté par : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Dates de la manifestation : - .....

Lieu de la manifestation : - .....

Activités prévues : - .....

Effectif théorique en fonction de l'activité prévue : - .....

|       | Responsable organisme                                                               | Vérificateur                                                                        | Propriétaire | Organisateur |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nom : | TRINCHE                                                                             | BRUNO TRINCHE                                                                       |              |              |
| Date  | 15/04/2018                                                                          | 15/04/2018                                                                          |              |              |
| Visa  |  |  |              |              |


AGENCE DE VERIFICATIONS TECHNIQUES

165 ch Chevalier le Bernica

97435 SAINT GILLES LES HAUTS

02.62.22.57.36 06.92.44.00.89

Ms. West - Circo diametro mt. 18.00 - H. 6.50 - h. 2.30  
Ring diametro mt. 0.80 - Contropali h. 4.156

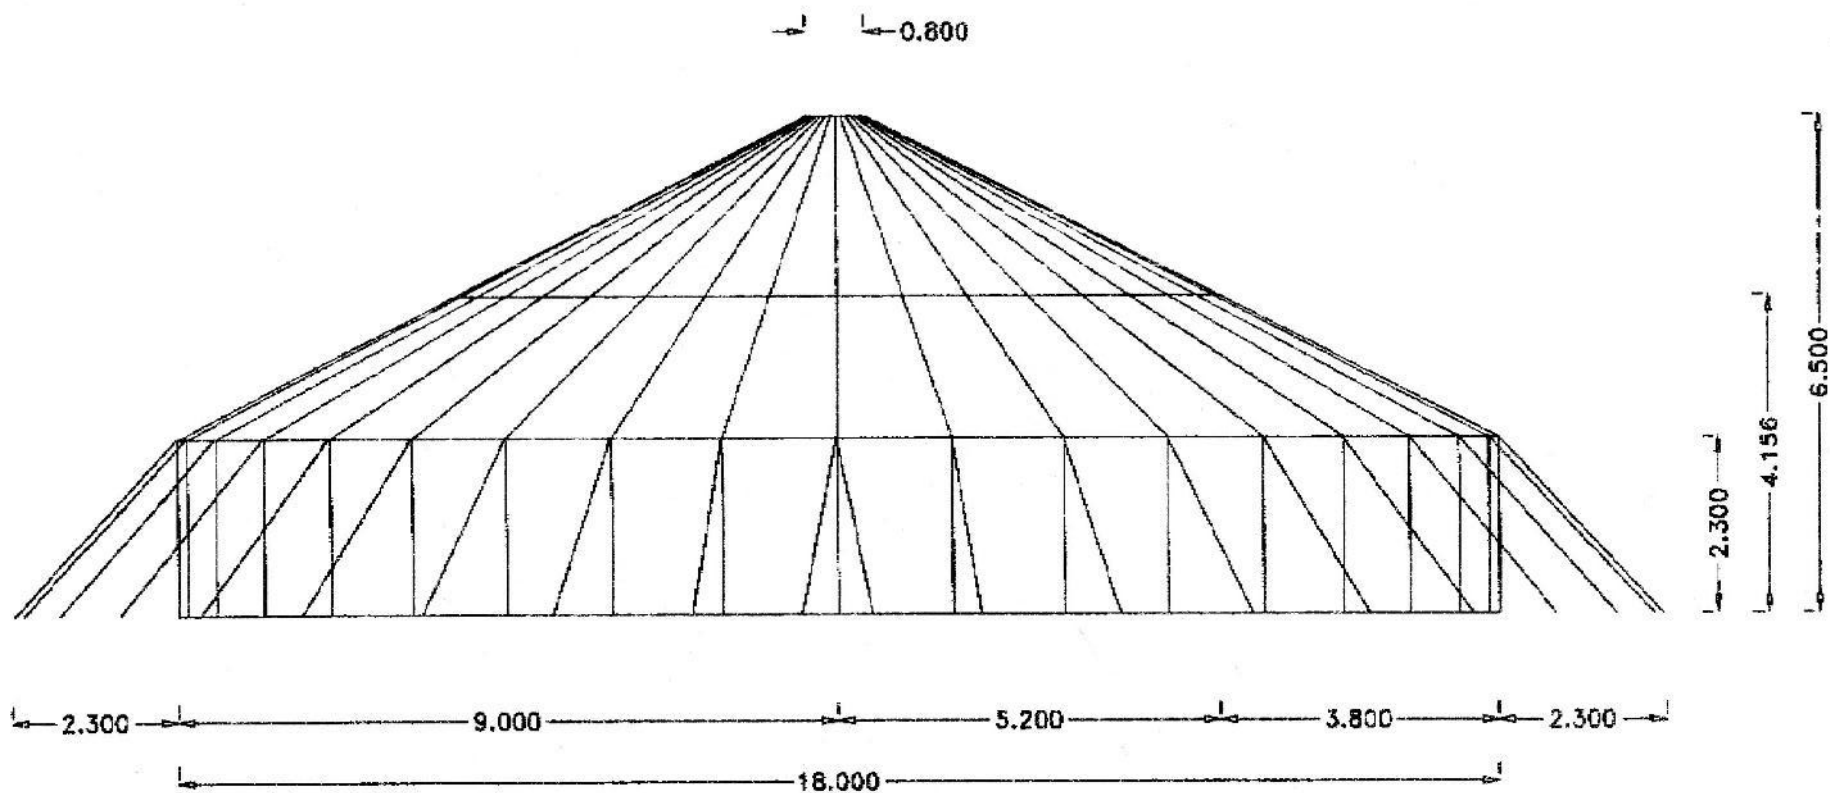

Ms. West — Circo diametro mt. 18.00 — H. 6.50 — h. 2.30  
Ring diametro mt. 0.80 — Contropali h. 4.156

Tetto In 2 pezzi

Saldatura cm 8

